

都市再生整備計画 事後評価シート
加茂川内水対策計画地区

令和2年2月

岐阜県美濃加茂市

様式2-2 地区の概要

加茂川内水対策計画地区(岐阜県美濃加茂市) 都市再生整備計画事業の成果概要

まちづくりの目標	目標を定量化する指標		従前値		目標値		評価値	
	指標	単位	値	年	値	年	値	年
大目標 加茂川流域における浸水被害の軽減に向けた安全・安心なまちづくり 目標1 国、県、市、地域住民で策定した「加茂川総合内水対策計画」に沿って、災害に強いまちづくりを目指す。 目標2 誰もが地域で安全に安心して生活ができるための環境整備をおこなう。	床上浸水戸数	単位:戸	9	H25	0	H30	0	H30
	自主防災組織の組織率	単位:%	65	H25	90	H30	82	H30
	防災訓練の実施率	単位:%	65	H25	90	H30	76	H30


基幹事業
流域貯留浸透施設




基幹事業
太田西公園整備事業




基幹事業
市道光徳田中線
道路改良事業

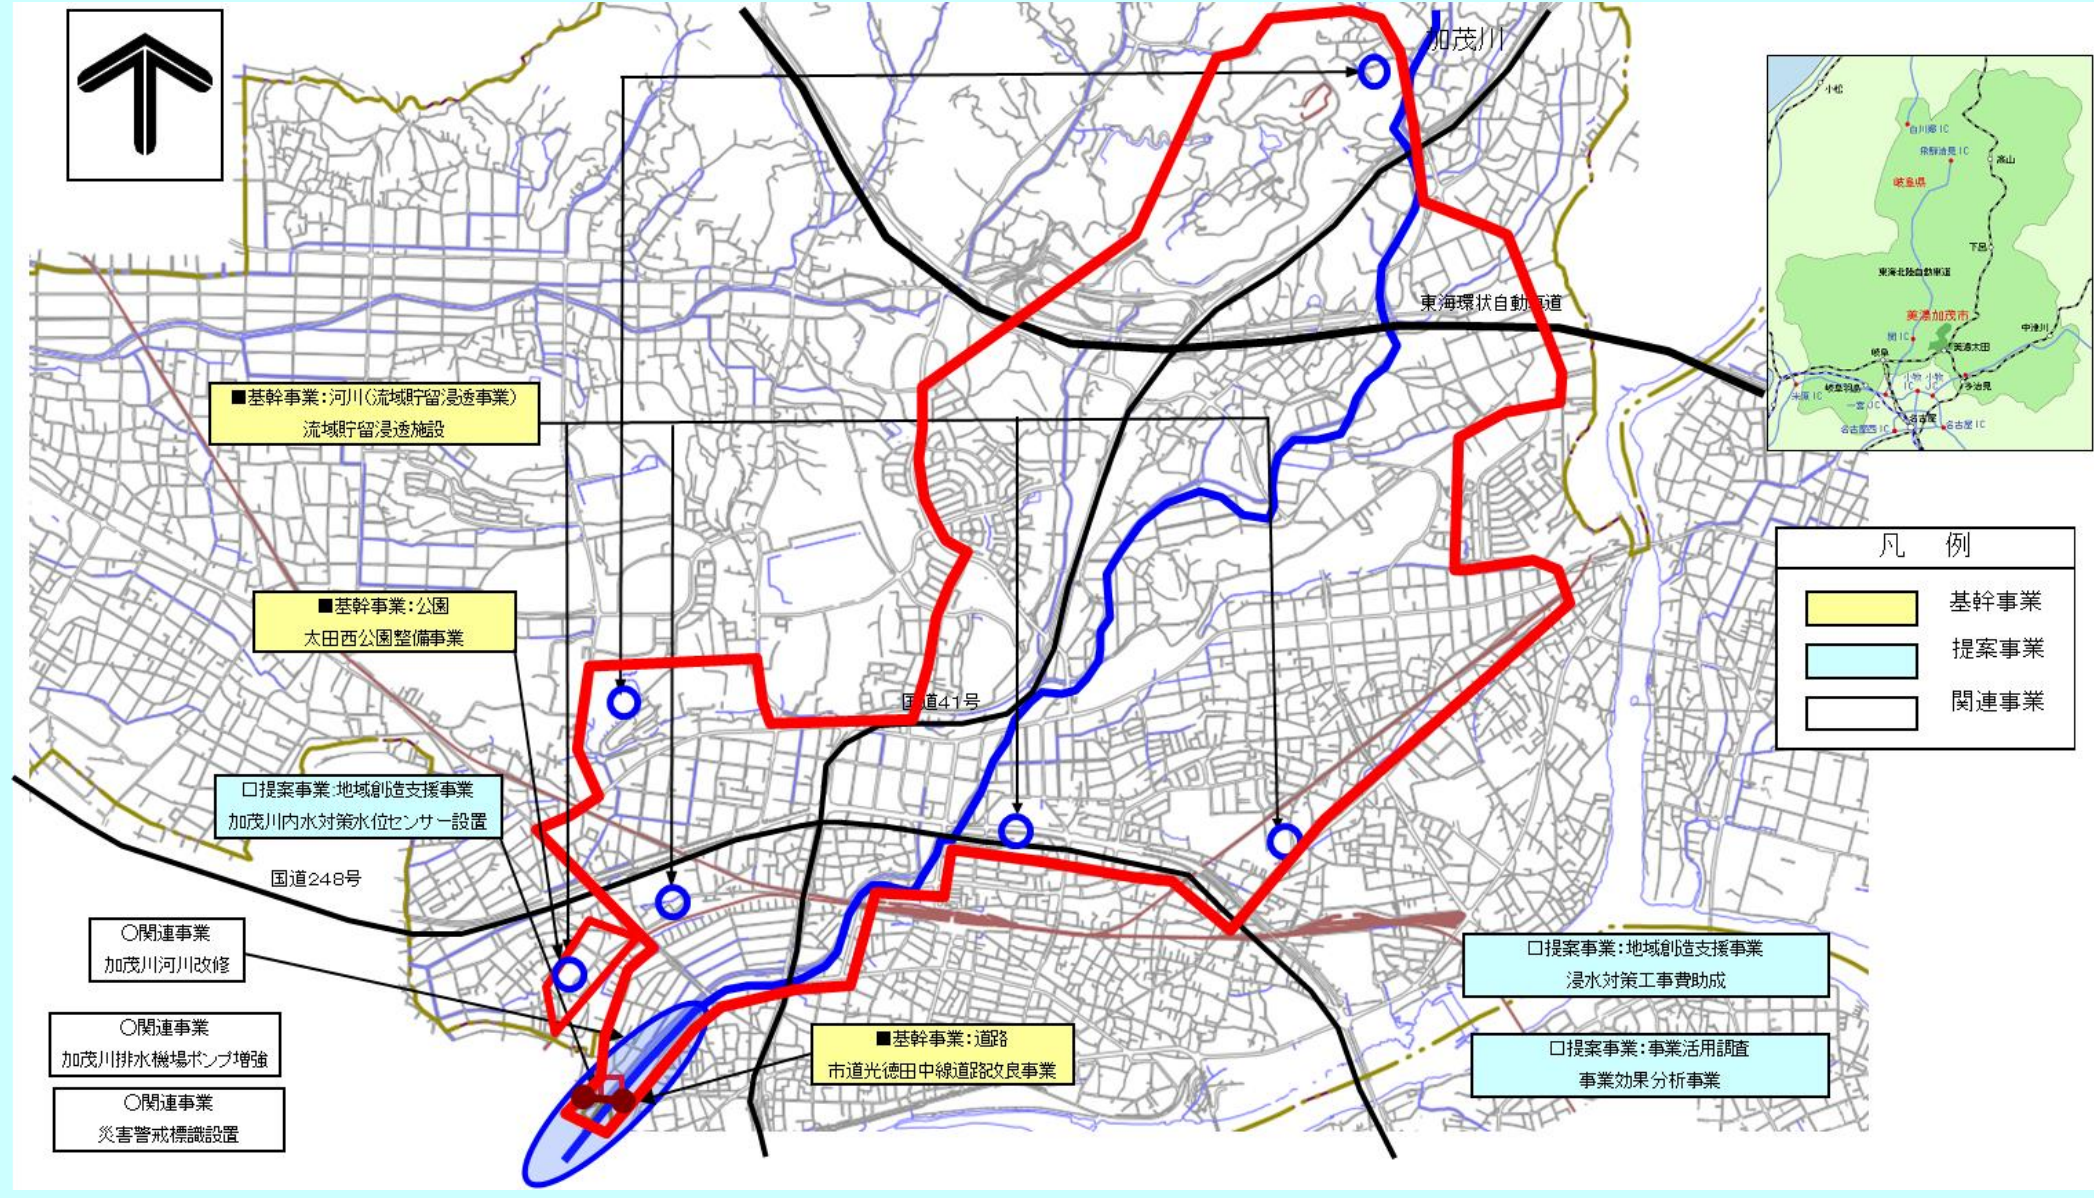
提案事業
加茂川内水対策
水位センサー設置



提案事業
浸水対策工事費助成



関連事業
災害警戒標識設置



まちの課題の変化	<ul style="list-style-type: none"> 各小中学校の屋外運動場や総合運動場等における流域貯留施設の整備が進んだことにより、地域防災対策の充実が図られた。 流域貯留浸透施設整備事業と併せ、内水排除のための排水機場ポンプの増強等を行うことにより、浸水世帯が減少され、地域防災力が增强された。 太田西公園内に避難施設となる体育館を整備し、住民の活動の場となるとともに、地域による防災活動の機会の創出が図られ、地域防災拠点が增强された。 組織の高齢化、防災技術の伝達・継承等の課題も残されている。
今後のまちづくりの方策 (改善策を含む)	<ul style="list-style-type: none"> 地域コミュニティのさらなる醸成を図りながら、地域で支え合う共助の仕組みづくりに発展させていき、地域の防災力の強化と災害に強いまちづくりの活性化をめざす。 地域にある防災設備の点検や管理を通じて、地域の防災意識を醸成するとともに、消防関係者や行政との連絡体制・組織を構築し、密接に連携をとる。 市広報やホームページ等を利用して防災施設の周知を徹底するほか、多様なかたちで防災訓練や防災に関するイベントを行うことで、市民の防災意識を高め、災害時でもしっかりと防災機能が果たせるよう対策する。
